




変更記載事項

令和1年10月11日
















No	図面番号	変更前	変更後
1	A-2		床点検口(ステンレス:600×600):1箇所追記
2	A-2		天井点検口(アルミ:450×450):2箇所追記 (開口補強含む)
3	A-2		天井開口補強(300×300): 3箇所追記

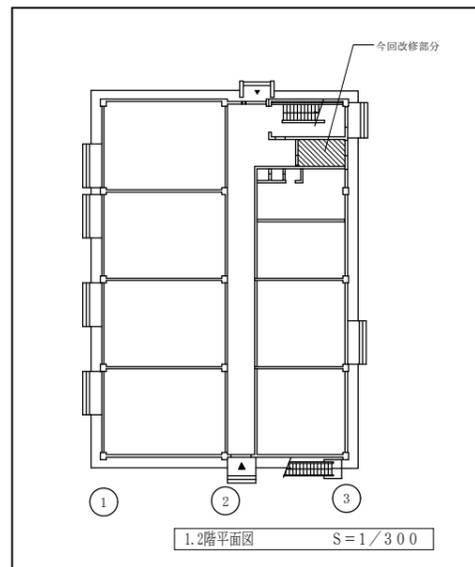

位置図

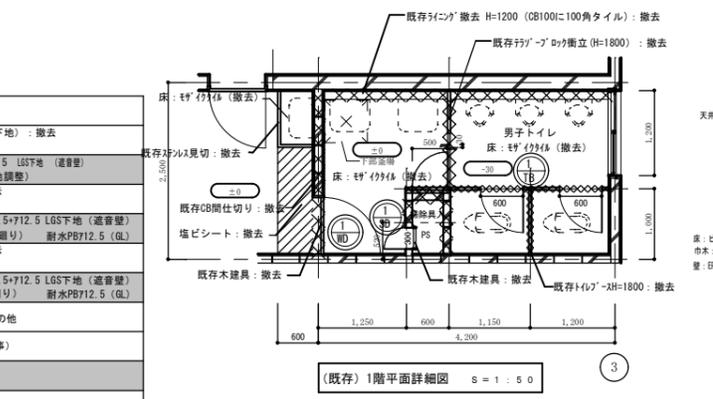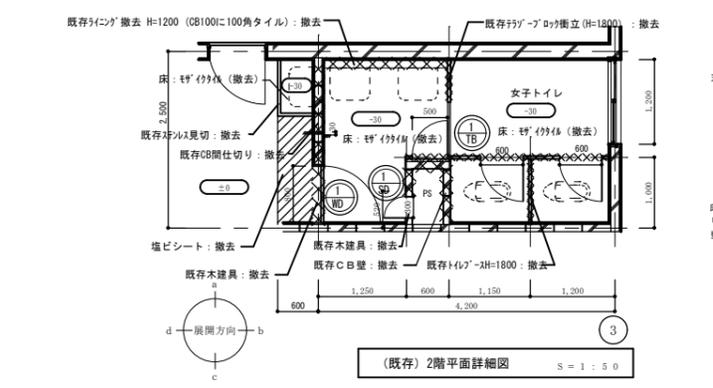

内部分仕表		天井高 (mm)	床	巾木	壁
廊下	改修前	2.450	ビニル床シート貼り t=2mm (一部撤去)	ビニル幅木 H=60 (一部撤去)	EP塗 強化PB下地 (CB100下地) : 撤去
	改修後	2.450	ビニル床シート貼り t=2mm (一部新設)	モザイクタイル貼り (一部撤去)	EP-G塗 強化PB 712.5+712.5 LGS下地 (遮音壁) 既存モルタル下地 (下地調整)
男子トイレ	改修前	2.600	モザイクタイル貼り (撤去)	100%タイル貼り (撤去)	100%タイル 強化PB下地 : 撤去
	改修後	2.400	水廻り用ビニル床シート貼り t=2mm モルタル下地	床材立ち上げ H=100	化粧タイル貼ア6 強化PB712.5+712.5 LGS下地 (遮音壁) 耐水PB712.5+712.5 (PS SK裏り) 耐水PB712.5 (GL)
女子トイレ	改修前	2.600	モザイクタイル貼り (撤去)	100%タイル貼り (撤去)	100%タイル 強化PB下地 : 撤去
	改修後	2.400	水廻り用ビニル床シート貼り t=2mm モルタル下地	床材立ち上げ H=100	化粧タイル貼ア6 強化PB712.5+712.5 LGS下地 (遮音壁) 耐水PB712.5+712.5 (PS SK裏り) 耐水PB712.5 (GL)
		天井高	天井	その他	
廊下	改修前	2.450	EP塗 プラスターボード t=9mm下地 (一部撤去) LGS下地 (一部撤去)		衛生陶器 (撤去) (別途工事)
	改修後	2.450	EP-G塗 石膏ボード t=9.5mm下地 (一部新設) LGS下地 (一部新設)		
男子トイレ	改修前	2.600	EP塗 フレキシブルボード t=4mm下地 (撤去) LGS下地 (撤去)		衛生陶器 (撤去) (別途工事)
	改修後	2.400	EP-G塗 タイル貼 t=6mm目透し (新設) LGS下地 (新設)		隔て板、小便器ライニング 身障者用手摺
女子トイレ	改修前	2.600	EP塗 フレキシブルボード t=4mm下地 (撤去) LGS下地 (撤去)		衛生陶器 (撤去) (別途工事)
	改修後	2.400	EP-G塗 タイル貼 t=6mm目透し (新設) LGS下地 (新設)		隔て板 身障者用手摺

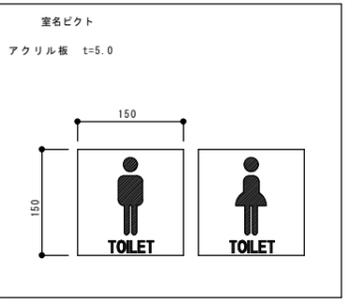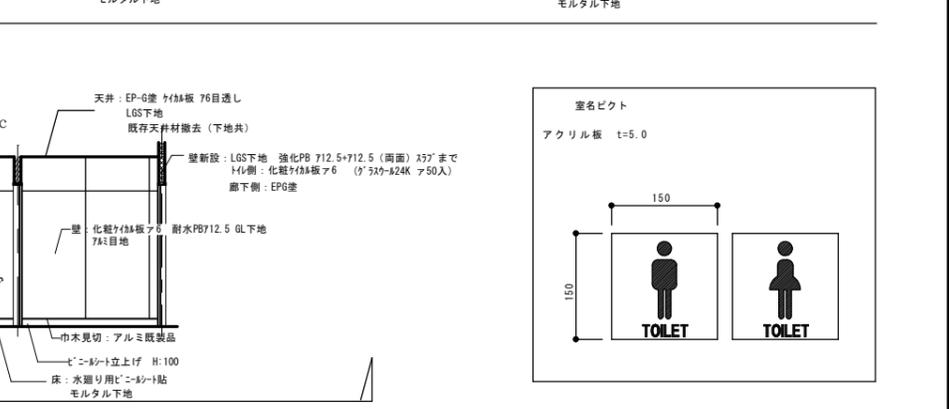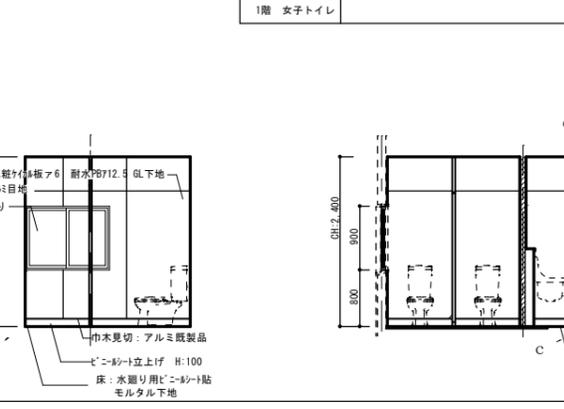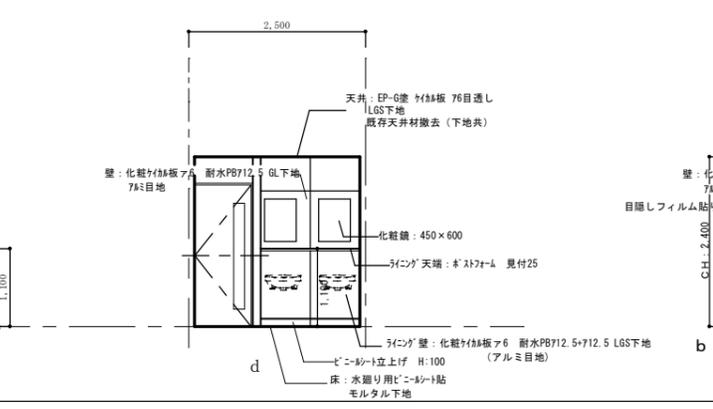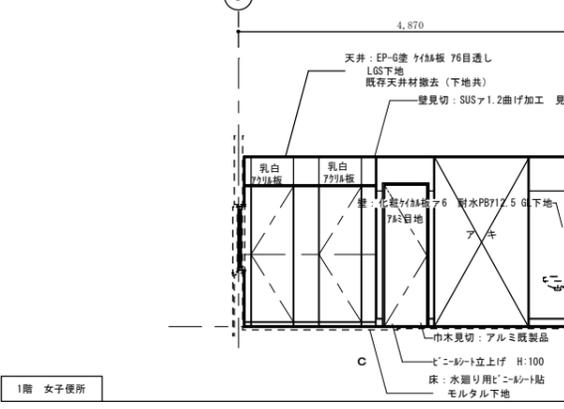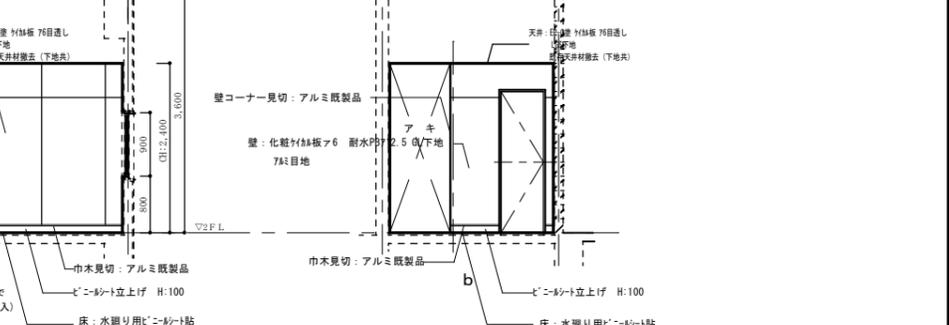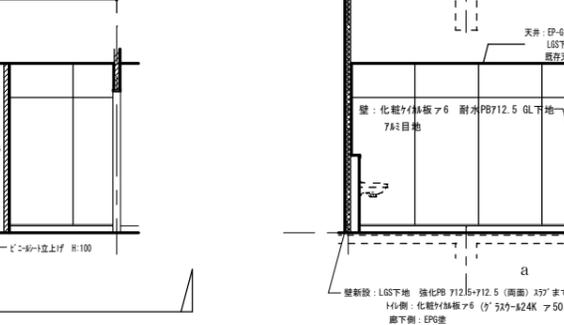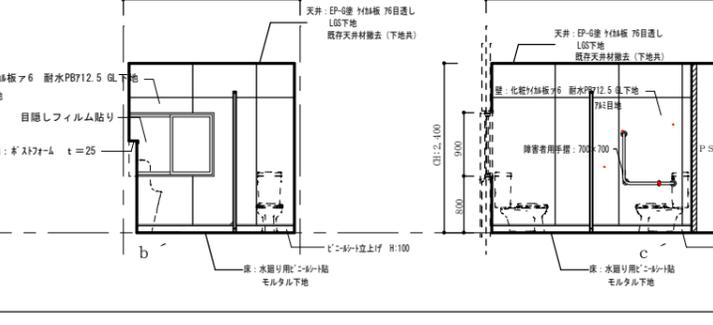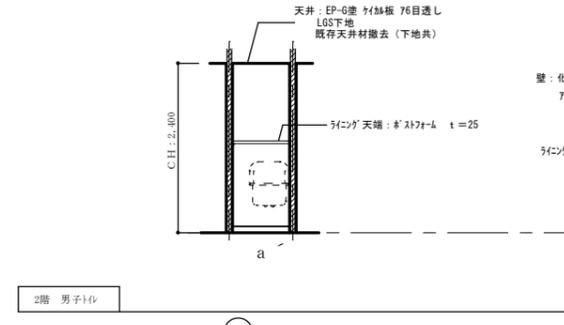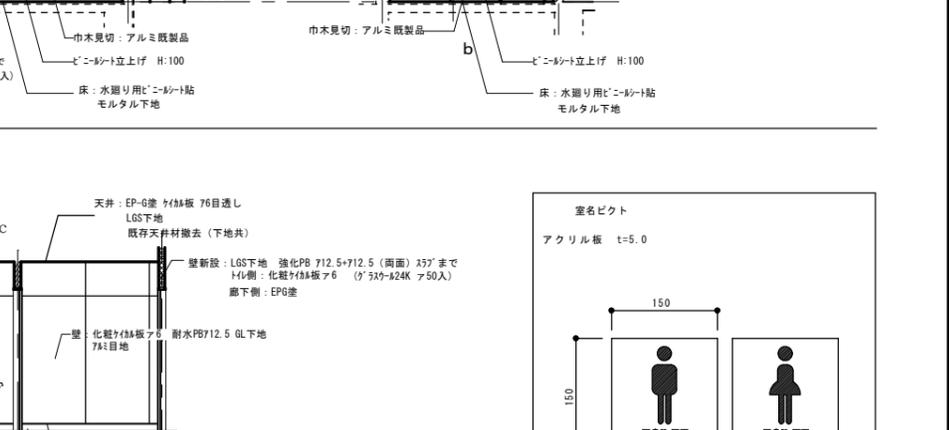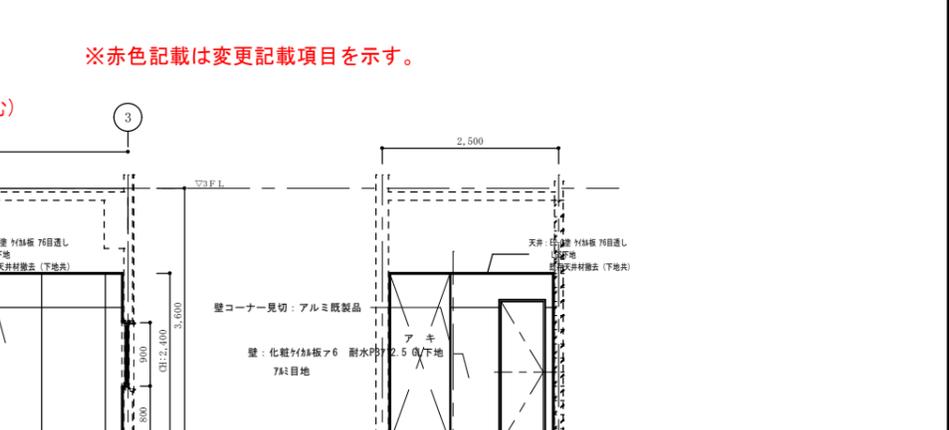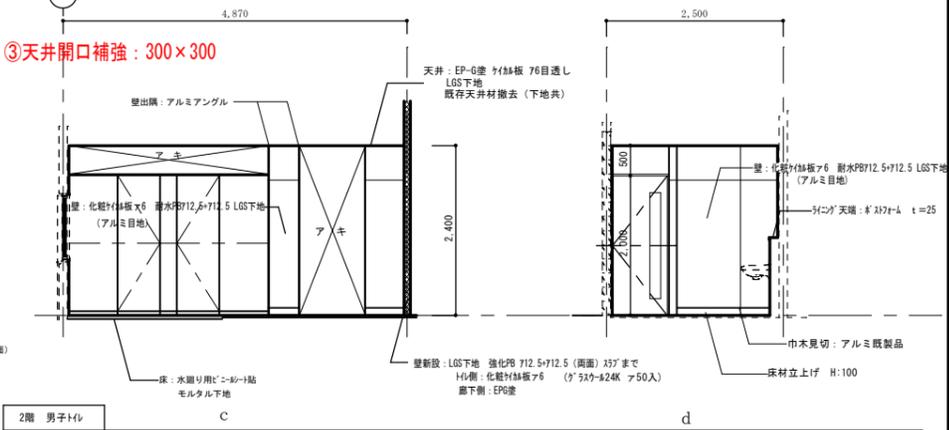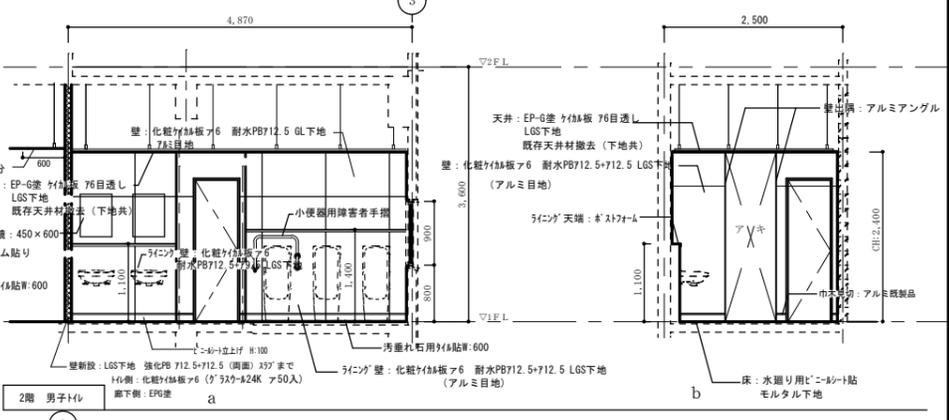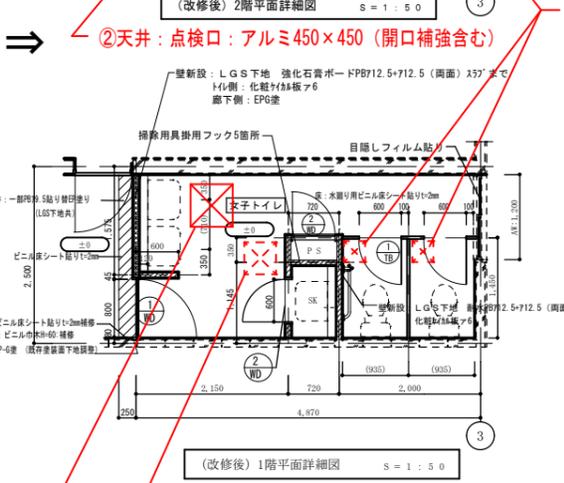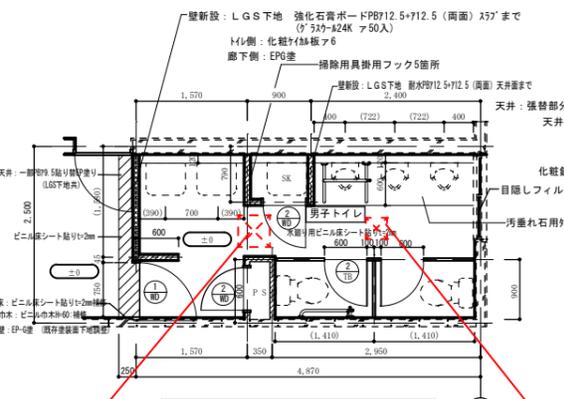

②天井：点検口：アルミ450×450 (開口補強含む)
 ③天井開口補強：300×300
 ①床：点検口：ステンレス 600×600
 ②天井：点検口：アルミ 450×450 (開口補強含む)

※赤色記載は変更記載項目を示す。
